



## BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

### EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA UTI

Empresa Executora: CONSTRUTORA CAMPOS GUERRA LTDA  
Obra: COMPLEXO HOSPITALAR MÁRIO KROEFF - RUA MAGÉ, 326 - PENHA - RIO DE JANEIRO  
Responsável Técnico: RILEY POSSATI CAMPOS

Medição N° : 9ª  
Período: 01/04/2022 A 30/04/2022

#### PLANILHA DE MEDIÇÃO

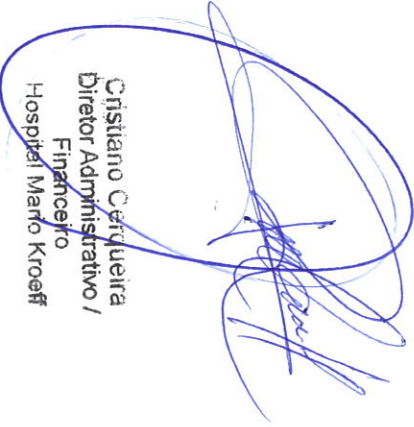
ITEM	CODIGO	Discriminação do Item	Unid.	Preço Unitário A	Quantidade Prevista Total B	Quantidade Executada Nesta Medição C	Valor (R\$) Previsto Total AxB	Valor (R\$) Executado Nesta Medição AxC
10		<b>REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE</b>						<b>73.364,19</b>
10.4	13331.0015-F	Revestimento de piso cerâmico em porcelanato natural, tráfego intenso(P.E.I. IV), 90 x 90cm, assentes em superfície em osso com argamassa de cimento e cola (argamassa colante) e rejuntamento pronto	M²	223,09	667,49	186,95	148.910,34	41.706,82
10.6	13.196.0100-A	Forro aramado monolítico de drywall, composto de uma chapa gesso acartonado, tipo standard, largura de 600mm, comprimento de 2000mm e espessura de 12,5mm, com tratamento juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acart	M²	156,53	609,69	142,52	95.434,78	22.308,25
10.7	13.348.0050-F	Peitoris em granito Branco Itaipua, espessura de 2cm, largura 15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, sabro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco	M	132,48	70,57	70,57	9.349,11	9.349,11
11		<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>						<b>29.406,55</b>
11.5	17.018.0060-A	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários	UND	1.136,06	6,00	6,00	6.816,36	6.816,36
11.6	14.006.0150-F	Porta de madeira de lei em compensado, de 120 x 210 x 3cm, em 2 folhas, aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, com visor conforme projeto, exclusive ferragens.	UND	1.108,70	4,00	4,00	4.434,80	4.434,80
11.7	14.006.0160-F	Porta de madeira de lei em compensado, de 160 x 210 x 3cm, em 2 folhas, aduela de 13 x 3cm e alizares 5 x 2cm, com visor conforme projeto, exclusive ferragens. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UND	1.165,41	1,00	1,00	1.165,41	1.165,41
11.8	12.104.000.200	Porta automática deslizante, para alto fluxo de pessoas, duas folhas fixa e duas móveis com vidro liso temperado, para vão de 2,40 x 2,10m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO	UND	16.989,98	1,00	1,00	16.989,98	16.989,98

Jorge Luiz Campos Leal  
Infraestrutura  
Hospital Mario Kroeff

Christiano Carqueja  
Diretor Administrativo /  
Elauroso

André Luiz L. de Barros  
Gerente de Contratos  
Hospital Mario Kroeff

13		<b>PINTURA</b>							<b>80.698,34</b>
13.1	17.018.0060-A	Preparo de superfícies novas, com revestimento liso interno ou externo, inclusive uma demão de selador acrílico, duas demãos de massa acrílica e lixamentos necessários	M²	35,08	839,19	839,19	29.438,92	29.438,92	
13.3	COMPOSIÇÃO	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, três demãos. AF_06/2014.	M²	22,05	2.324,69	2.324,69	51.259,41	51.259,41	
14		<b>DIVERSOS</b>						<b>8.130,92</b>	
14.1	18.018.0010-F	Cortina divisória hospitalar, sem emendas, confeccionada em vinil de alta espessura, de aproximadamente 0,4mm, antichama, anti-fungo, bactericida e antiestático, com altura de 2,60m, pintura eletrostática branca, inclusive ilhoses, trilhos, ganchos, rodízios	M	327,20	24,85	24,85	8.130,92	8.130,92	
<b>TOTAL</b>							-	<b>191.600,00</b>	

  
**Cristiano Cerqueira**  
 Diretor Administrativo /  
 Financeiro  
 Hospital Mario Kroeff

  
**André Luiz L. de Barros**  
 Gerente de Compliance  
 gestão de Contratos  
 Hospital Mario Kroeff

  
**Jorge Luiz Gomes Leal**  
 Infraestrutura  
 Hospital Mario Kroeff
